

Id	% completac	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	dom 18 may			jue 22 may	
					12	12	12	12	12
1	100%	PROGRAMA PARA LA REPARACION DE LA INDICACION DEL KM 18+134.57 DEL OLEODUCTO DE 16"Ø BELLOTA - EDEN - CARDENAS NORTE.	lun 22/06/09	sáb 18/07/09					
2	100%	UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA INDICACION MEDIANTE COORDENADAS GPS.	lun 22/06/09	lun 22/06/09					
3	100%	TRAMITES DE PERMISOS DE PASO.	mar 23/06/09	vie 26/06/09					
4	100%	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO Y ACCESO AL SITIO DE TRABAJO.	sáb 27/06/09	mar 30/06/09					
5	100%	CORRELACION DE CARRETES POR MEDIO DE SOLDADURAS DE REFERENCIA.	mar 30/06/09	mar 30/06/09					
6	100%	FABRICACION E INSTALACION DE CERCOS DE PROTECCION CON LETREROS DE SEGURIDAD.	mié 01/07/09	mié 01/07/09					
7	100%	EXCAVACION, DEZASOLVE Y BOMBEO DE ACHIQUE EN TERRENO: FIRME, PANTANOSO, INUNDABLE O LACUSTRE (RIO, LAGUNA O CANAL).	mié 01/07/09	jue 02/07/09					
8	100%	LIMPIEZA EXTERIOR DEL DUCTO CON RETIRO DE LASTRE Y RECUBRIMIENTO DIELECTRICO.	vie 03/07/09	sáb 04/07/09					
9	100%	VERIFICACION DE LA INDICACION MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y ULTRASONICA, DEFINIENDOSE LA ZONA SANA.	lun 06/07/09	mar 07/07/09					
10	100%	EVALUACION Y ANALISIS DE INTEGRIDAD DE INDICACIONES APLICANDO CODIGOS Y NORMAS.	mié 08/07/09	vie 10/07/09					
11	100%	REPARACION MEDIANTE ENVOLVENTE METALICA DE LA LONGITUD DEL SEGMENTO DEL DUCTO (SI SE REQUIERE).	sáb 11/07/09	mié 15/07/09					
12	100%	REPOSICION DEL RECUBRIMIENTO DIELECTRICO DEL TRAMO REPARADO.	jue 16/07/09	jue 16/07/09					
13	100%	TAPADO Y COMPACTADO DE RELLENO EN EXCAVACION.	vie 17/07/09	vie 17/07/09					
14	100%	RESTAURACION DEL TERRENO.	sáb 18/07/09	sáb 18/07/09					

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

	lun 26 may		vie 30 may		mar 03 jun		sáb 07 jun		mié 11 jun		dom 15 jun		jue 19 jun	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

lun 23 jun		vie 27 jun		mar 01 jul		sáb 05 jul		mié 09 jul		dom 13 jul		jue 17 jul		lun 21 jul
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

	vie 25 jul		mar 29 jul		sáb 02 ago		mié 06 ago		dom 10 ago		jue 14 ago		lun 18 ago	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

vie 22 ago		mar 26 ago		sáb 30 ago		mié 03 sep		dom 07 sep		jue 11 sep		lun 15 sep		vie 19 sep
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

	mar 23 sep		sáb 27 sep		mié 01 oct		dom 05 oct		jue 09 oct		lun 13 oct		vie 17 oct	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

mar 21 oct		sáb 25 oct		mié 29 oct		dom 02 nov		jue 06 nov		lun 10 nov		vie 14 nov		mar 18 nov
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

	sáb 22 nov		mié 26 nov		dom 30 nov		jue 04 dic		lun 08 dic		vie 12 dic		mar 16 dic	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

sáb 20 dic		mié 24 dic		dom 28 dic		jue 01 ene		lun 05 ene		vie 09 ene		mar 13 ene		sáb 17 ene
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

	mié 21 ene		dom 25 ene		jue 29 ene		lun 02 feb		vie 06 feb		mar 10 feb		sáb 14 feb	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

mié 18 feb		dom 22 feb		jue 26 feb		lun 02 mar		vie 06 mar		mar 10 mar		sáb 14 mar		mié 18 mar
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

	dom 22 mar		jue 26 mar		lun 30 mar		vie 03 abr		mar 07 abr		sáb 11 abr		mié 15 abr	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12


Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

dom 19 abr		jue 23 abr		lun 27 abr		vie 01 may		mar 05 may		sáb 09 may		mié 13 may		dom 17 may
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			


	jue 21 may		lun 25 may		vie 29 may		mar 02 jun		sáb 06 jun		mié 10 jun		dom 14 jun	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			

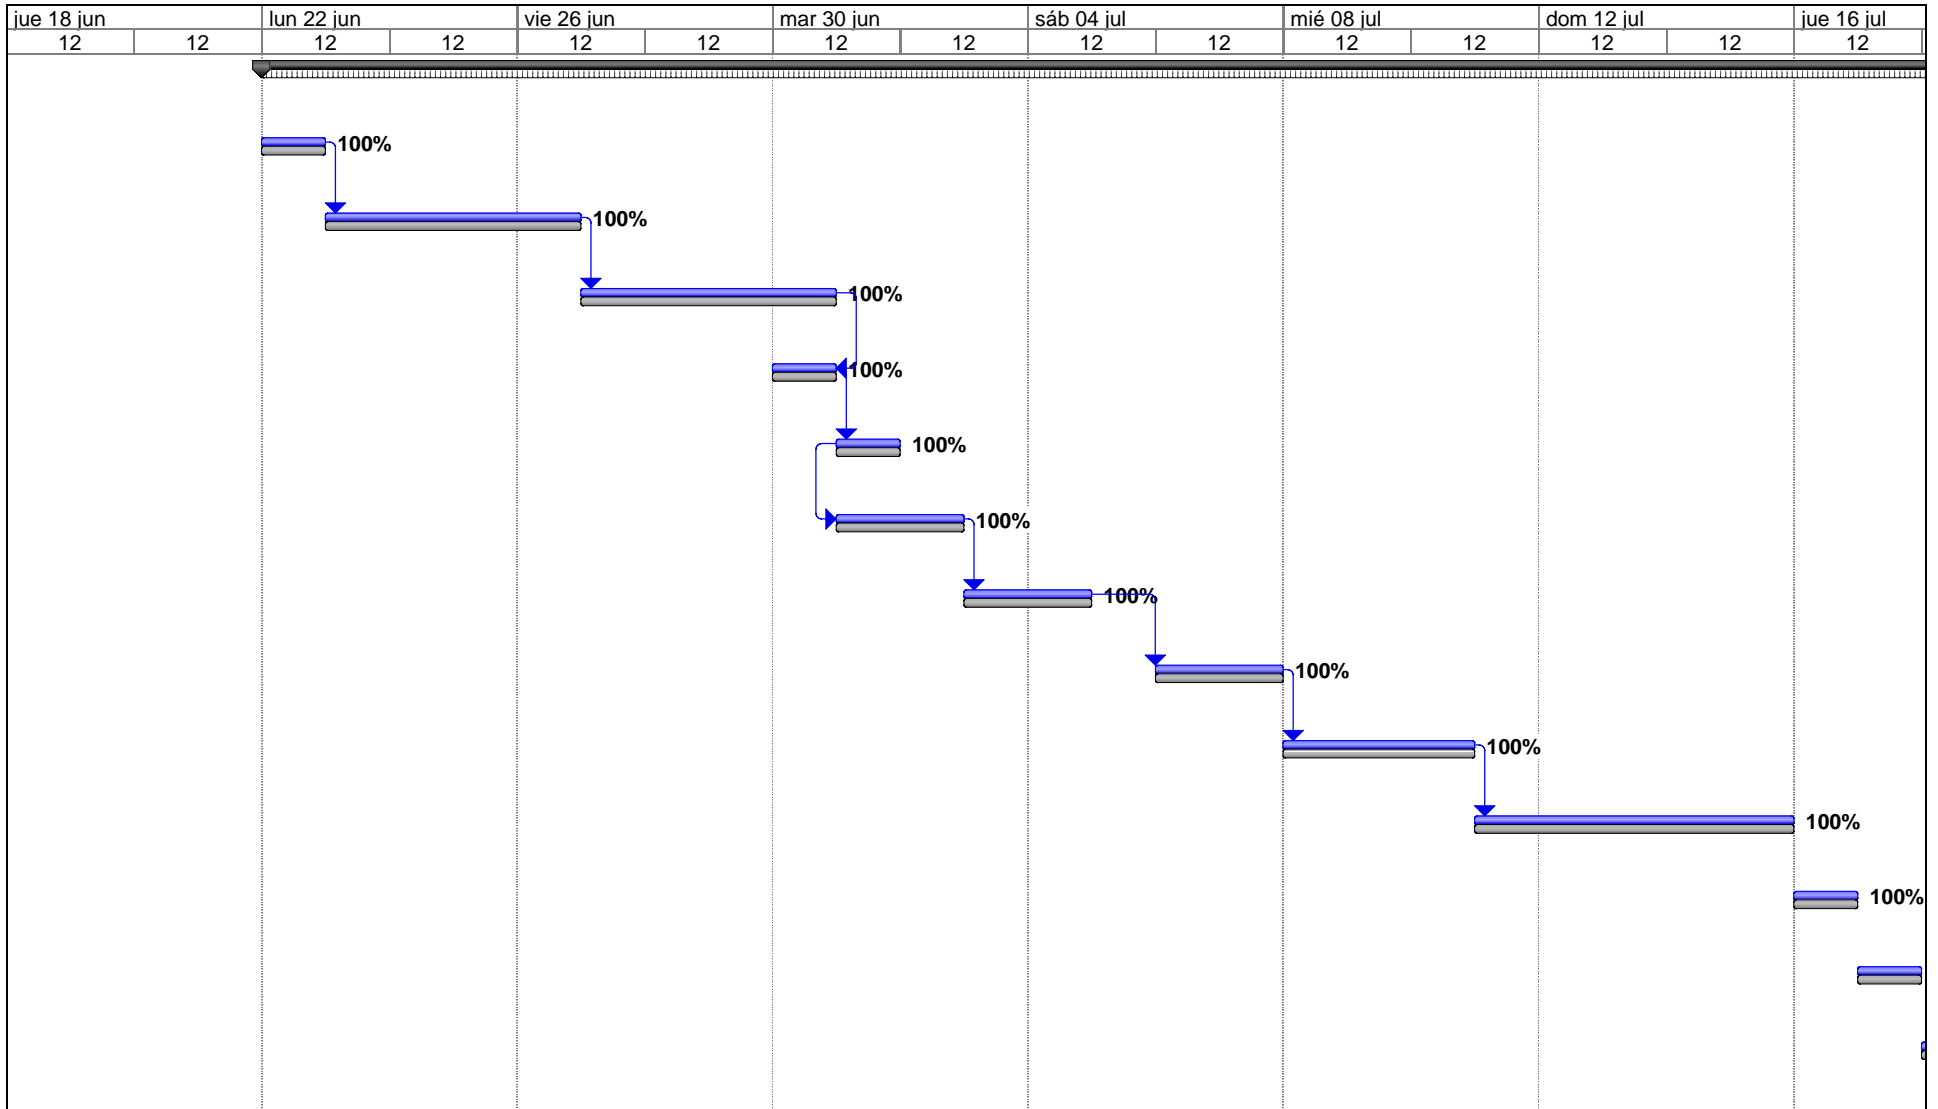

Proyecto: Project4
 Fecha: sáb 11/12/10

Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
Tarea		Hito		Fecha límite	
División		Progreso del resumen			
Progreso de tarea		Resumen			

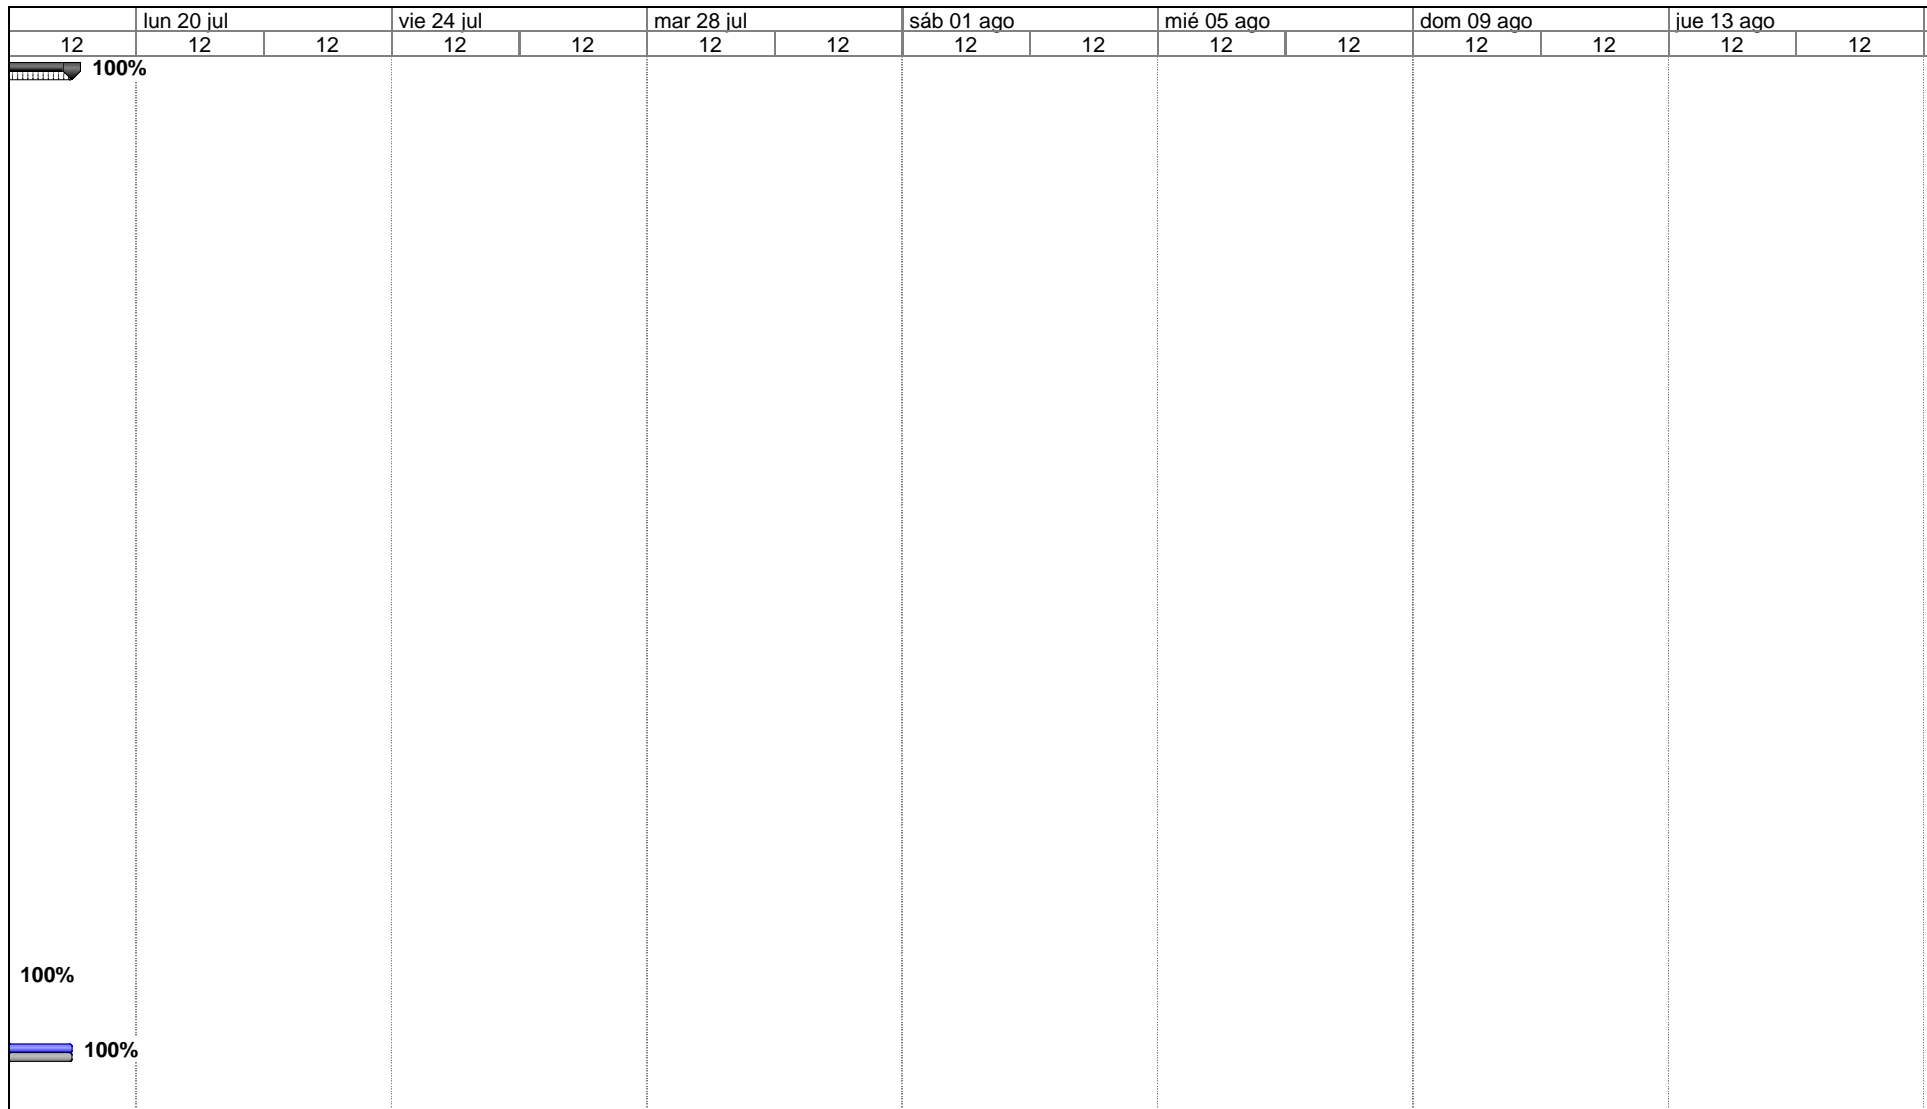

Proyecto: Project4 Fecha: sáb 11/12/10	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			
